



Владелец /оператор /покупатель данного оборудования несет исключительную ответственность за проверку того, что поступающая вода проходит всестороннюю проверку, по крайней мере на:

- Свободный хлор
- Хлорамин
- TDS (общее количество растворенных твердых веществ)
- Кремнезем
- pH
- ТН (общая жесткость)
- * Хлорид
- Щелочность

и, при необходимости, обеспечить средства очистки воды, которые отвечали бы минимальным требованиям стандартов качества воды UNOX, как указано в спецификации продукта.
Несоблюдение этих минимальных стандартов потенциально может привести к повреждению оборудования и/или его компонентов и аннулированию гарантии производителя оригинального оборудования.

Характеристики подаваемой воды	• Электропроводность [uS/cm]	
	• Общая жесткость [°d]	
	• Хлориды [ppm]	

Название компании-поставщика воды:

	ДА	НЕТ
• Установлена система очистки воды?	☐	☐
• Все свойства соответствуют руководству по установке?	☐	☐
• Тип очистки воды (название продукта)		
• Свойства очищенной воды		
Электропроводность [uS/cm]		
Общая жесткость [°d]		
Хлориды [ppm]		


	ДА	НЕТ
• Установлена система очистки воды?	☐	☐
• Тип очистки воды (название продукта)		
• Свойства очищенной воды		
Электропроводность [uS/cm]		
Общая жесткость [°d]		
Хлориды [ppm]		



В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ, ЕСЛИ ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ ЗАПОЛНЕНА НЕ ПОЛНОСТЬЮ, вы берете на себя ответственность за качество воды, поступающей в установленные устройства. Если проблемы, такие как, образование известкового налета или коррозии приточная вода должна быть протестирована сторонней лабораторией.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАНАЛИЗАЦИИ

	ДА	НЕТ
• Используется термостойкая труба?	☐	☐
• Угол наклона трубы ($\geq 4^\circ$)?	☐	☐
• На слив установлен гидрозатвор или воздушный клапан ?	☐	☐
Не обязательно - только фаст-фуд		
Убедитесь, что подключение для слива воды доступно в пределах 1 метра от печи?	☐	☐
Соответствует ли слив в канализацию спецификациям для одного из типов дренажной установки, перечисленных ниже?	☐	☐

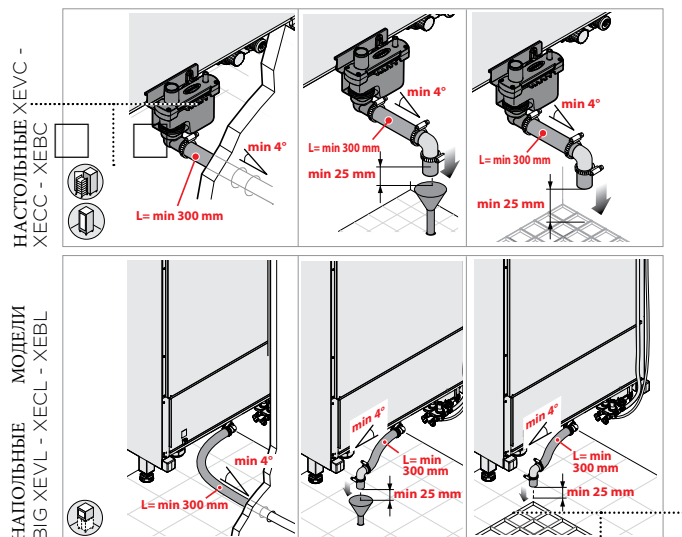

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

УЗО установлены для устройств?
Указать размер [mA]

Автоматический выключатель, установлен для устройств? Укажите размер [A]

Тип электропитания		
1PH-PE	3PH-N-PE	
2PH-PE	3PH-PE	
Укажите значение напряжения		
L1/L - N [V]	L1 - PE [V]	L2 - PE [V]
L1 - L2 [V]	L2 - N [V]	L3 - N [V]
L1 - L3 [V]	L2 - L3 [V]	L3 - PE [V]

	ДА	НЕТ
Устройства защиты, соответствуют спецификации?	☐	☐
Напряжение соответствует номиналу?	☐	☐

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

	ДА	НЕТ
Температура и влажность соответствуют требованиям UNOX?	☐	☐
Аэрация помещения соответствует местным и национальным нормам и требованиям UNOX?	☐	☐
Вентиляция соответствует местным и национальным нормам и требованиям UNOX?	☐	☐

Вытяжная вентиляция печи была произведена с помощью:

- вытяжной зонт UNOX
- общая система вентиляции
- отсутствует

В случае установки под общий вытяжной зонт

Измерьте расстояние от задней стенки печи до переднего края вытяжного зонта [см]

Измерьте расстояние от пола до нижнего края вытяжного зонта [см]

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ		
	ДА	НЕТ
Был ли ПО обновлено до последней версии?	☐	☐
Укажите версию ПО		
Завершена ли процедура установки под руководством пользователя?	☐	☐
Завершена ли калибровка влажности?	☐	☐

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ	
Подключение к Интернету было осуществлено через:	
• Wifi • Ethernet	
Сделайте фото экрана панели управления с информацией об успешном подключении к сети	

ЗАГРУЗКА ПРОГРАММ ВЫПЕЧКИ И БЛОКИРОВКА		
	ДА	НЕТ
Была ли произведена загрузка программ приготовлений с USB носителя на печь?	☐	☐
После загрузки программы приготовления отобразились в библиотеке?	☐	☐
Программы приготовления были заблокированы в настройках?	☐	☐
Ручной режим приготовления заблокирован в настройках?	☐	☐

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
	ДА	НЕТ
Были ли предоставлены клиенту руководство по эксплуатации и информация об оборудовании?	☐	☐
Был ли клиент обучен правильному использованию оборудования?	☐	☐
Был ли клиент проинформирован обо всех возможных рисках, которые могут возникнуть в результате неправильного использования оборудования?	☐	☐
Был ли удален наконечник с термощупа?	☐	☐
Все ли защитные наклейки были прикреплены к оборудованию?	☐	☐

ФОТООТЧЕТ	
Фото печи с фронтальной части	
Фото подключение к сливу в канализацию (гидрозатвор)	
Фото розетки/автоматического выключателя	
Фото подключение к водопроводу	
Фото розетки/автоматического выключателя	
Фото модели и серийного номера	
Фото экрана с информацией о платах	

ИМЯ И ФАМИЛИЯ ПРОВЕРЯЮЩЕГО:

ДАТА:

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ:

ИМЯ И ФАМИЛИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ:

ДАТА:

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ:

